COMMITTENTE

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI VIZZINI
Provincia di Catania

INTERVENTO

Programma Innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II - Colle del Castello"

PROGETTO ESECUTIVO

(D. Lgs. 163/2006, art.93 - D.P.R. 207/2010, art.33 e segg. - L.R. 12/2011)

VISTI

ELABORATO N°	OGGETTO	SCALA
E	ELABORATI TECNICI-ECONOMICI	
E.4	CRONOPROGRAMMA	

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESIONISTI :

iTOS PROGETTI
via Papa Giovanni XXIII, 11/A
93014 Mazzarino (Caltanissetta) Italy
tel-fax +39 0934 1 [illegible]
tel-fax +39 0934 [illegible]
e-mail [illegible]@tiscali.it
www.[illegible].it

SMC

Direttore tecnico
Arch. Alfonso Ippolito

Arch .Gaetano Tosto

Arch. Chiara Lanza
(Giovane Professionista)

Arch. Cecilia Tosto
(Giovane Professionista)

Geol. Luigi Butticè

REVISIONE	REDATTORE	CONTROLLO	VISTO E APPROVAZIONE	DATA
0	Geom. Emma Santo	Arch. Giuseppe Ippolito	Arch. Alfonso Ippolito	30/07/2014
1				

COMMESSA	CATEGORIA	NOME FILE	IDENTIFICATIVO
2012-02	04 - PROGETTO ESECUTIVO / E - ELABORATI TECNICO-ECONOMICI	Tav. E.4 - Cronoprogramma.dwg	litos.2014.004556

DIAGRAMMA DI GANTT

RIEPILOGO:Prev. 02/01/2015 - 30/06/2016 = 546 gg. Giorni lavorativi Prev.381 gg
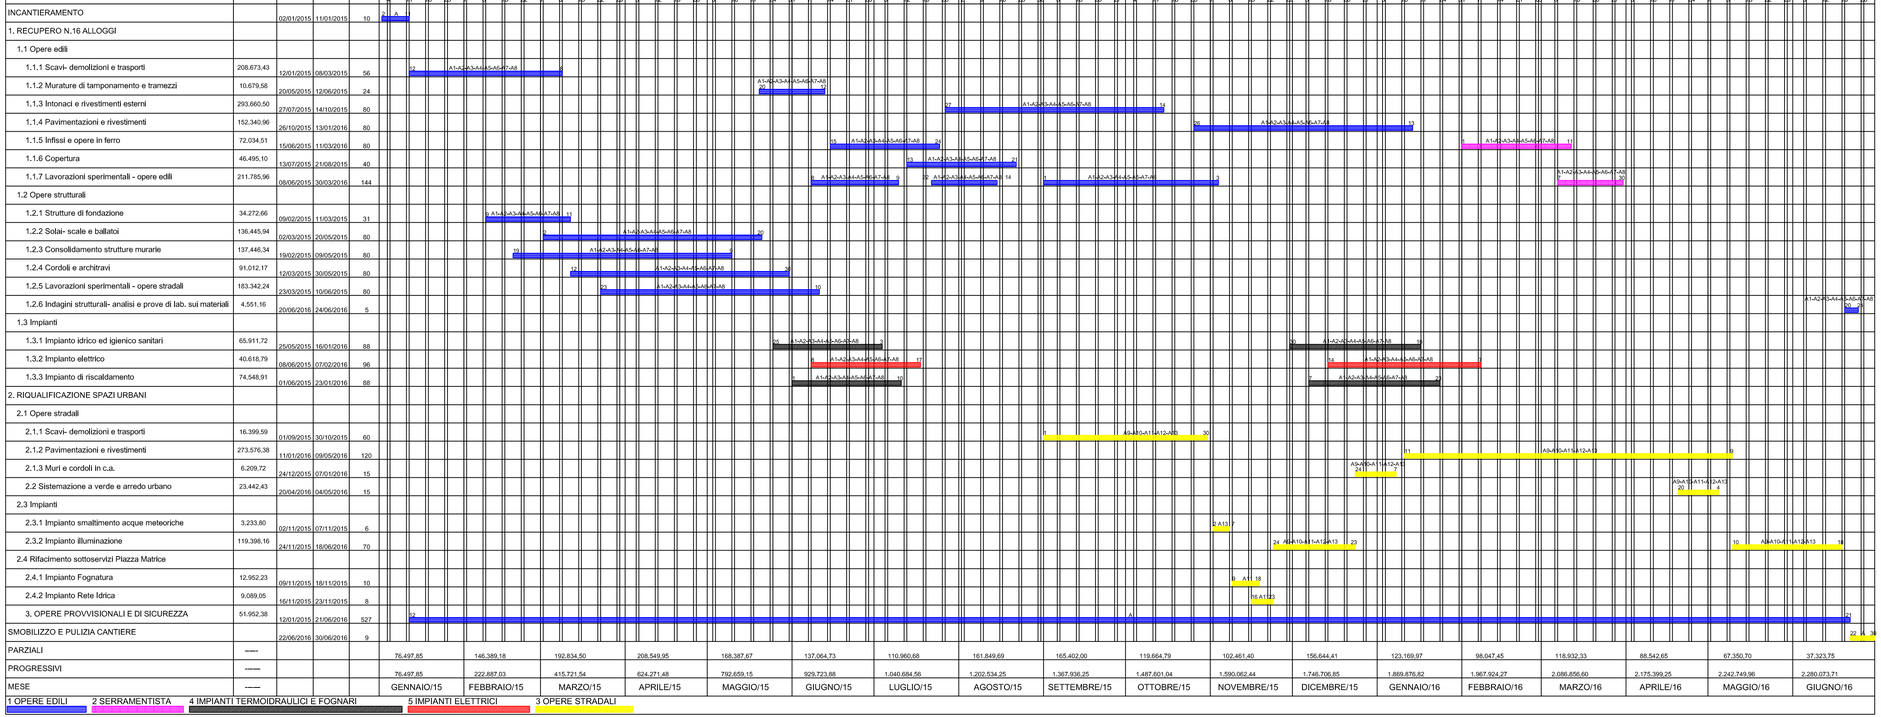
LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
INCANTIERAMENTO		02/01/2015	11/01/2015	10
1. RECUPERO N.16 ALLOGGI				
1.1 Opere edili				
1.1.1 Scavi- demolizioni e trasporti	208.673,43	12/01/2015	08/03/2015	56
1.1.2 Murature di tamponamento e tramezzi	10.679,58	20/05/2015	12/06/2015	24
1.1.3 Intonaci e rivestimenti esterni	293.660,50	27/07/2015	14/10/2015	80
1.1.4 Pavimentazioni e rivestimenti	152.340,96	26/10/2015	13/01/2016	80
1.1.5 Infissi e opere in ferro	72.034,51	15/06/2015	11/03/2016	80
1.1.6 Copertura	46.495,10	13/07/2015	21/08/2015	40
1.1.7 Lavorazioni sperimentali - opere edili	211.785,96	08/06/2015	30/03/2016	144
1.2 Opere strutturali				
1.2.1 Strutture di fondazione	34.272,66	09/02/2015	11/03/2015	31
1.2.2 Solai- scale e ballatoi	136.445,94	02/03/2015	20/05/2015	80
1.2.3 Consolidamento strutture murarie	137.446,34	19/02/2015	09/05/2015	80
1.2.4 Cordoli e architravi	91.012,17	12/03/2015	30/05/2015	80
1.2.5 Lavorazioni sperimentali - opere stradali	183.342,24	23/03/2015	10/06/2015	80
1.2.6 Indagini strutturali- analisi e prove di lab. sui materiali	4.551,16	20/06/2016	24/06/2016	5
1.3 Impianti				
1.3.1 Impianto idrico ed igienico sanitari	65.911,72	25/05/2015	16/01/2016	88
1.3.2 Impianto elettrico	40.618,79	08/06/2015	07/02/2016	96
1.3.3 Impianto di riscaldamento	74.548,91	01/06/2015	23/01/2016	88
2. RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI				
2.1 Opere stradali				
2.1.1 Scavi- demolizioni e trasporti	16.399,59	01/09/2015	30/10/2015	60
2.1.2 Pavimentazioni e rivestimenti	273.576,38	11/01/2016	09/05/2016	120
2.1.3 Muri e cordoli in c.a.	6.209,72	24/12/2015	07/01/2016	15
2.2 Sistemazione a verde e arredo urbano	23.442,43	20/04/2016	04/05/2016	15
2.3 Impianti				
2.3.1 Impianto smaltimento acque meteoriche	3.233,80	02/11/2015	07/11/2015	6
2.3.2 Impianto illuminazione	119.398,16	24/11/2015	18/06/2016	70
2.4 Rifacimento sottoservizi Piazza Matrice				
2.4.1 Impianto Fognatura	12.952,23	09/11/2015	18/11/2015	10
2.4.2 Impianto Rete Idrica	9.089,05	16/11/2015	23/11/2015	8
3. OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA	51.952,38	12/01/2015	21/06/2016	527
SMOBILIZZO E PULIZIA CANTIERE		22/06/2016	30/06/2016	9
PARZIALI	-----			
PROGRESSIVI	-----			
MESE	-----
