
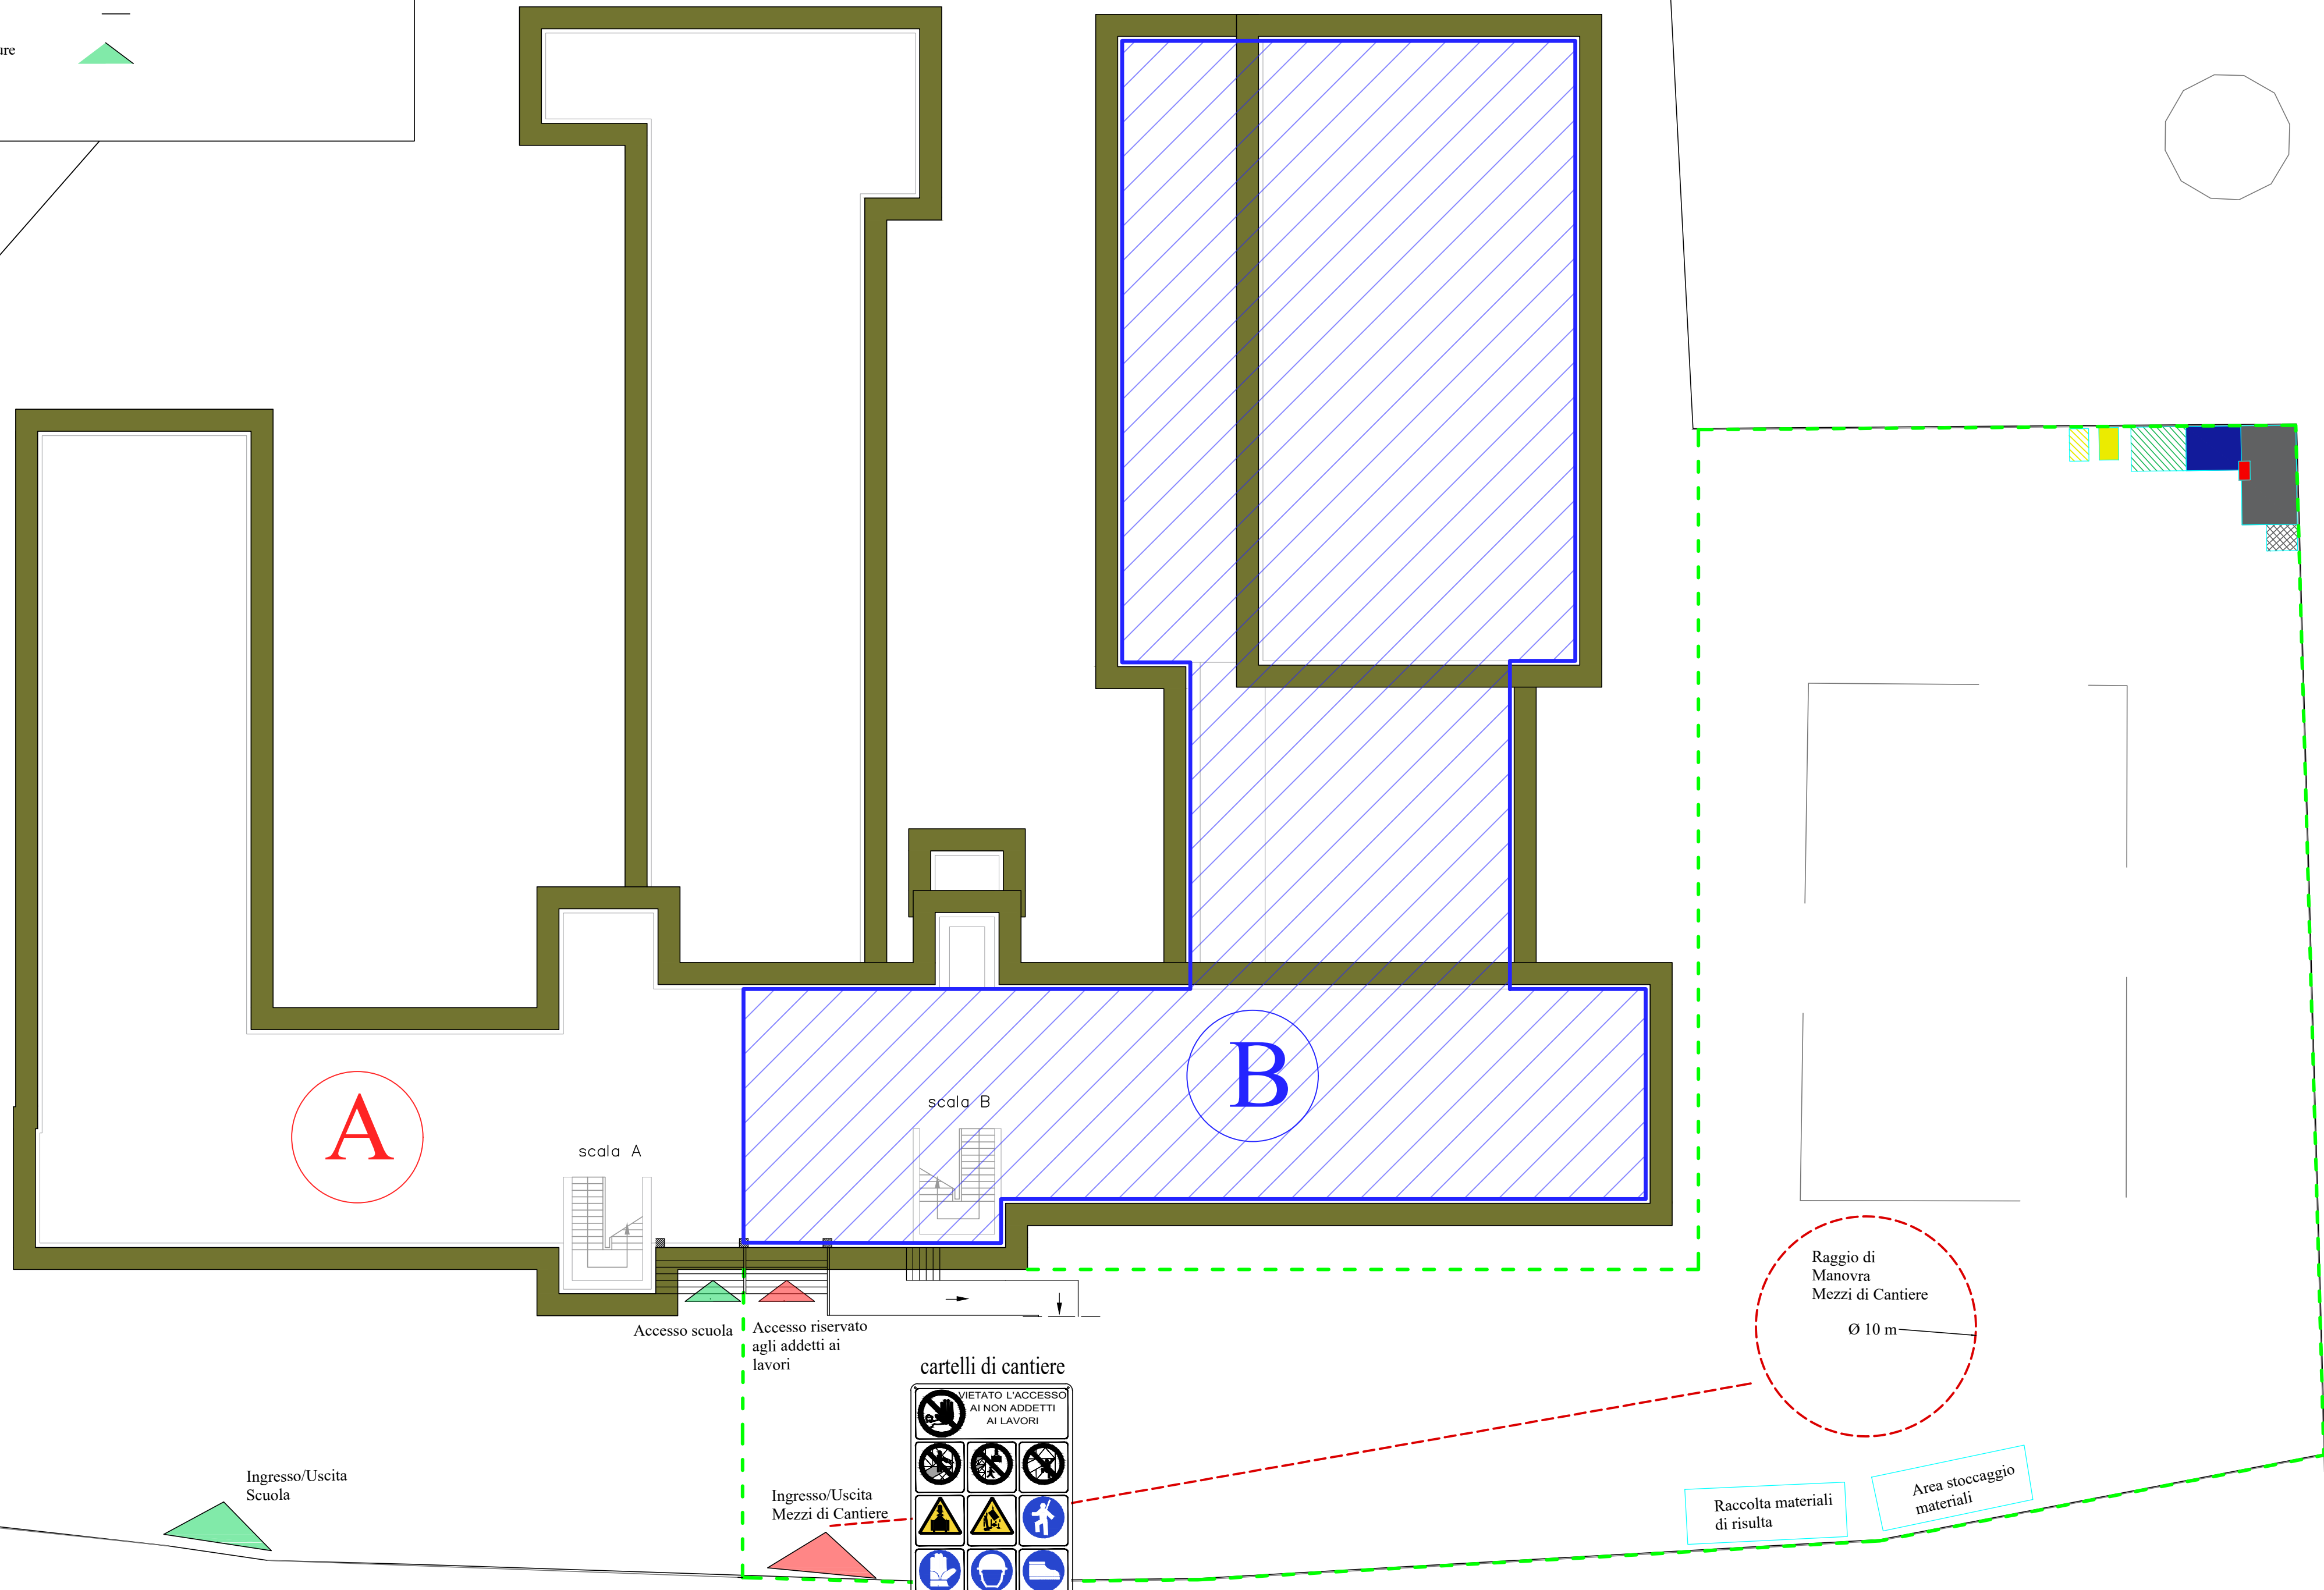


Legenda

- Recinzione di cantiere
- Percorso mezzi di cantiere
- Cassetta Pronto Soccorso
- Quadro Generale
- Dispersore di Terra
- Uffici
- Wc
- Deposito Attrezature
- Deposito D.P.I.
- Ponteggio

FASE DI LAVORAZIONE 2:

- 2.1. Lavorazioni corpo B primo piano. Gli addetti ai lavori accederanno al cantiere dalla scala B.
- 2.2. Lavorazioni corpo B piano terra. Durante la fase 2.2, il primo piano sarà completamente accessibile dalla scala A.



cartelli di cantiere

COMUNE DI PALAGONIA
Città Metropolitana di Catania

INTERVENTI PER L'ECO-EFFICIENZA E LA RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA G. PONTE

Planimetria organizzazione di cantiere: FASE 2

COMMESSA ALLEGATO **4**

TAVOLA **12b**

SCALA 1:200

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Saverio Sinatra	L'IMPRESA
PROGETTISTI: (Dott. Ing. P. Scravaglieri) (Dott. Ing. S. Cantale)	

GIGATECK ASSOCIATI

STUDIO TECNICO "GIGATECK ASSOCIATI"
VIA PASUBIO, N. 45, 95127 CATANIA
Tel. 095-316767 Fax 095-325264
E-mail: studio@gigateck.it
PEC: studio@pec.gigateck.it

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Data emissione progetto
0	PROGETTO ESECUTIVO	Geom. A. Orefice	22/03/2019	Ing. S. Cantale	26/03/2019	Ing. P. Scravaglieri	28/03/2019	02/04/2019
